

R4.2.18
資料2-1

河川整備の実施状況について

- 継続して、地権者把握を実施するとともに、国と協議中。
- 今年度、松瀉堰上流の堆積土撤去、川瀬橋付近の護岸工事及び支障物移設補償を実施している。



松瀉堰上流の堆積土砂撤去

長生村 金田地先 令和3年12月撮影




松瀉堰

一宮川


（用地）

- 用地機動班を活用しながら、年度末迄に全体約8.5haのうち、8割程度の用地契約を締結の見込み。
- 橋梁架換など、工期が比較的長期となる工事や工事用の進入路等に係る借地契約についても、用地契約と同時に交渉を行い、取得と借地を同時に契約するなどにより、工事に早期着手する。

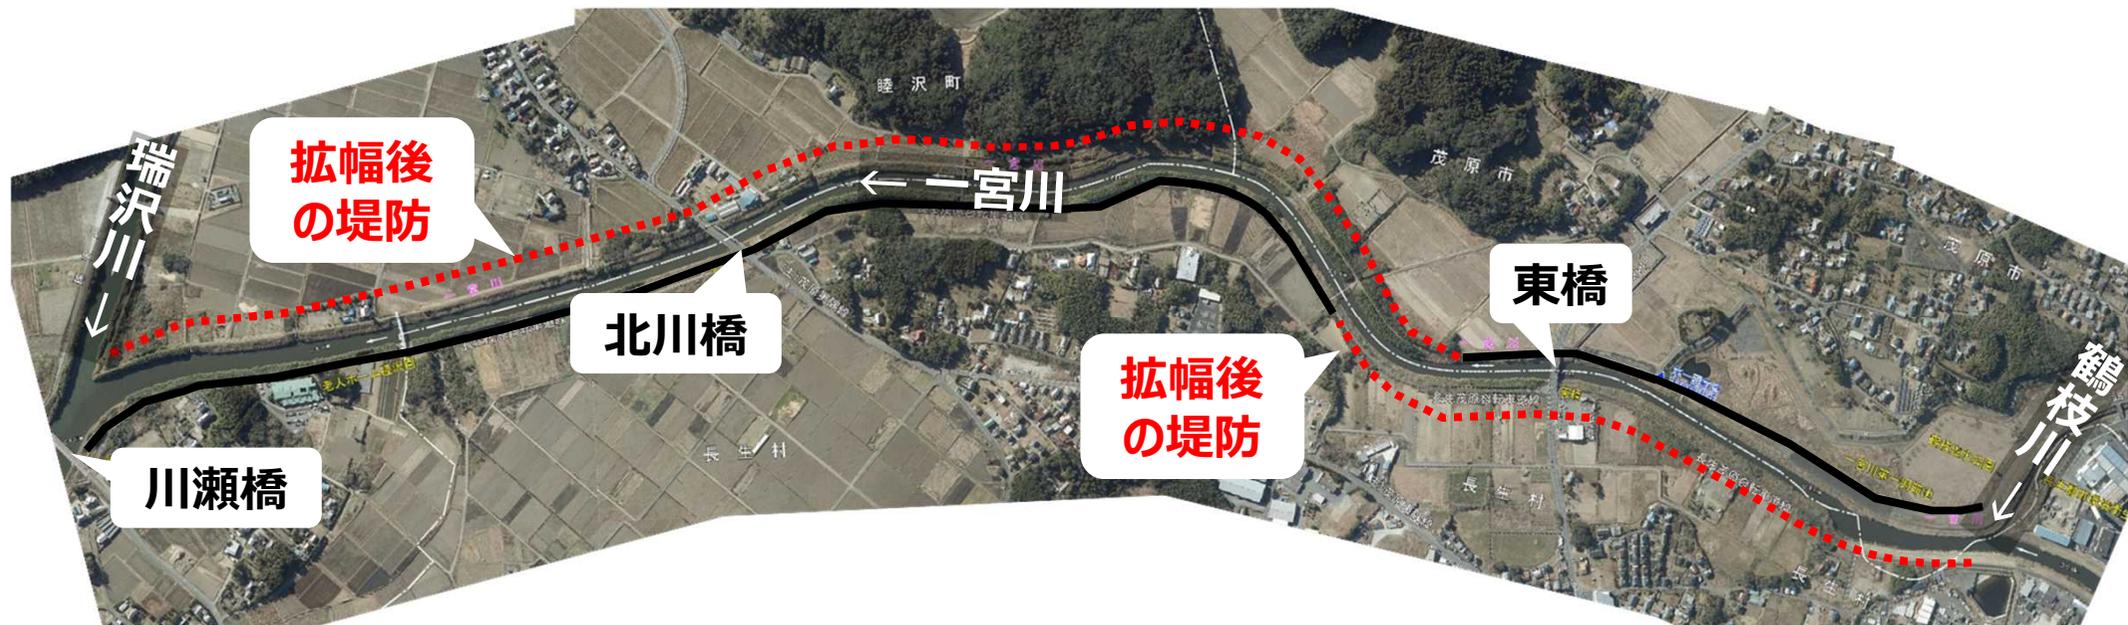

（工事）

- 河道拡幅に伴う橋梁架換や樋門移設等に着手。現在、用地買収を必要としない橋脚工事や、拡幅しない側の堤防嵩上げ工事を施工している。
- 今後の用地取得状況を踏まえつつ、年度末迄に、橋梁橋台工事やいくつかの樋門工事などを発注予定。

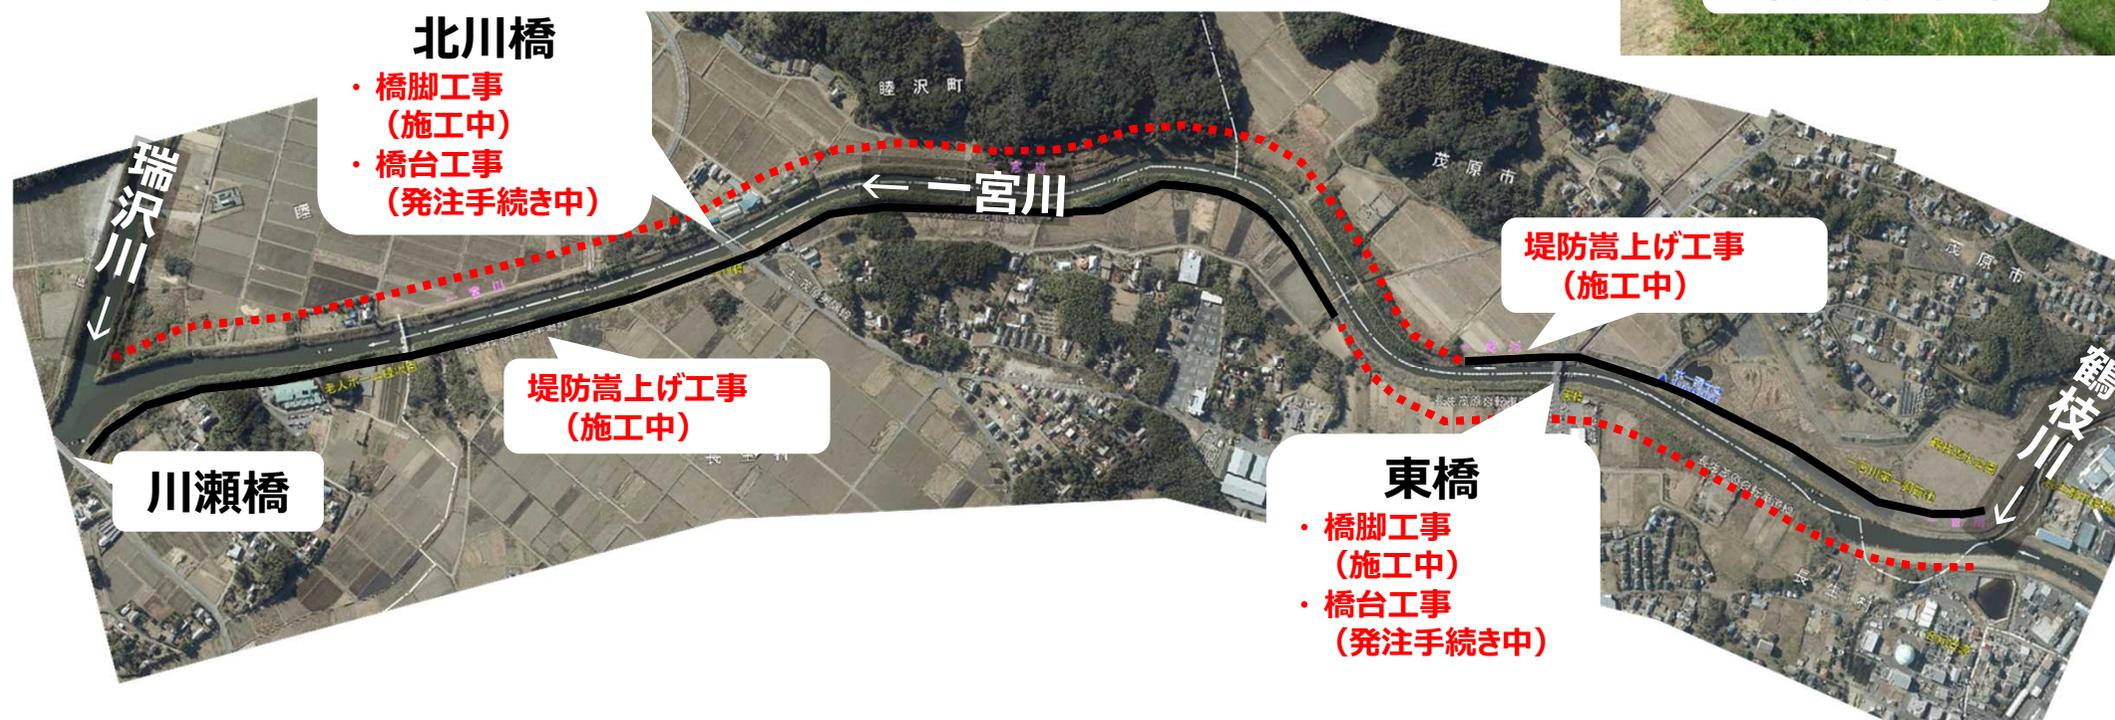


河道拡幅区間（瑞沢川合流点～鶴枝川合流点）

橋脚工事（東橋）

茂原市 猿袋地先 令和4年1月撮影



- 左岸側の護岸法立て（河道掘削、護岸整備）工事について、現場着手し、令和6年度末迄の完成を予定している。
- 茂原市域における短期対策として、令和4年8月末迄に、現況堤防より50cm程度嵩上げ（左岸仮設、右岸コンクリート壁）、河道断面の暫定掘削を行っている。

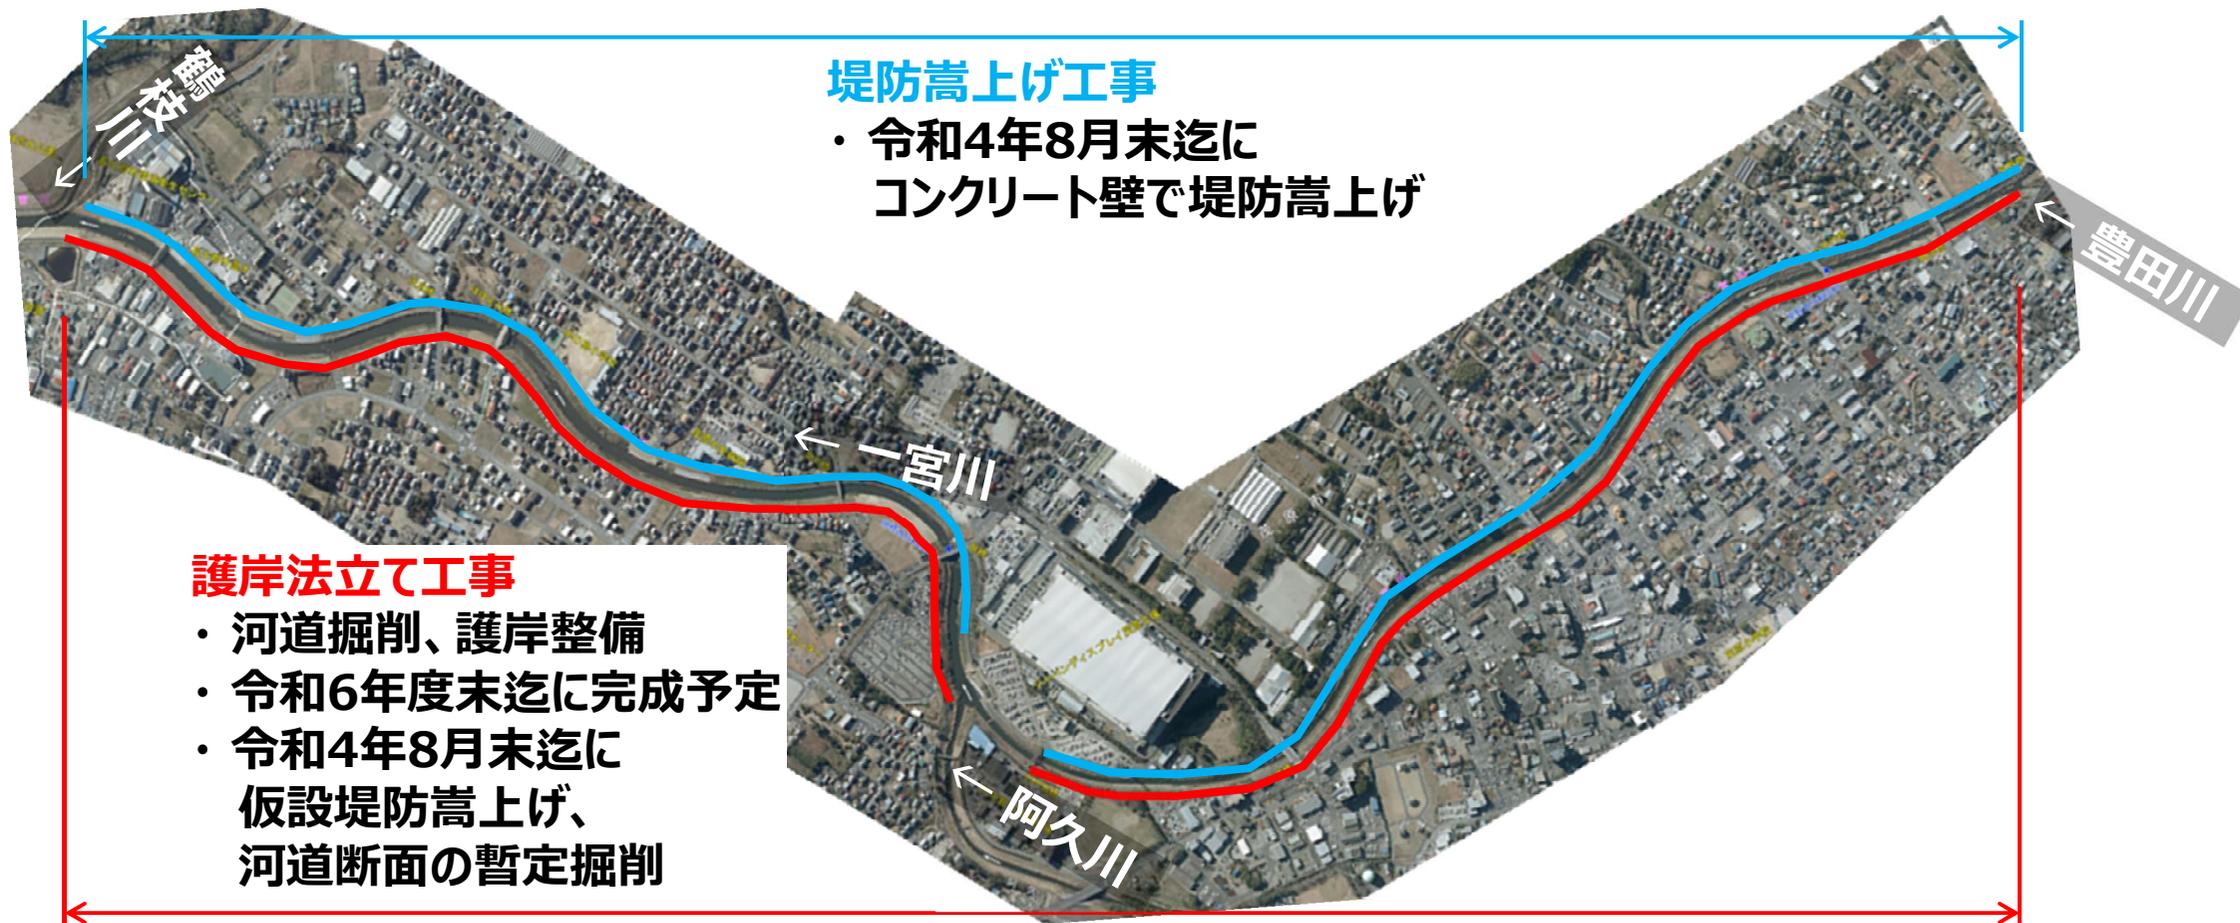

護岸法立て区間（鶴枝川合流点～豊田川合流点）


護岸法立て区間（仮設矢板打設）

茂原市 茂原地先 令和4年1月撮影



堤防嵩上げ工事

茂原市 長清水地先 令和3年10月撮影



茂原市 長清水地先 令和4年1月撮影



- 令和3年8月末時点で、貯留量約15万 m^3 の暫定供用を開始
令和4年8月末迄に、貯留量約25万 m^3 を確保し、
令和5年度末迄に、貯留量約40万 m^3 の完成を予定している。



- 令和6年度末迄に、集中的に竹木伐採等を実施。

一宮川、三途川合流点 砂田橋
(茂原市墨田地先、長南町須田地先)



一宮川 駒塚橋上流
(長柄町榎本地先、長南町岩川地先)



- 令和6年度末迄に、集中的に竹木伐採等を実施。

一宮川 清水橋下流

(長柄町小榎本地先、長南町岩川地先)



三途川 墨田橋下流

(茂原市墨田地先、長南町須田地先)

