

【別紙様式3】

再評価実施事業調書

番号	2	事業名	地すべり事業		路線又は箇所名等		地すべり防止区域 東		
事業所管課		河川整備課		事業主体		千葉県			
事業化年度	平成 29年度	用地着手年度	—	工事着手年度	平成29年度	再評価の理由	再評価		
				工事終了(認可)年度	令和12年度				
費用便益比 B/C	2.43 (2.12)	総費用	7.35億円 (4.85億円)	総便益	17.85億円 (10.27億円)	基準年	令和5年度	供用開始年度	令和12年度


※上段：全体事業 下段（ ）：残事業

<p>【事業概要】 (目的) 東は、指定面積98.71haの地すべり防止区域である。 保全対象は、人家18戸、県道鴨川富山線があり、地すべりにより交通が寸断された場合は、地域防災や生活、経済に与える影響は極めて大きい。 東地区では、一部の宅地や道路などで、地すべりの兆候が確認されている。 平成29年度から地すべり対策事業に着手し、地すべりを防止するため、集水ボーリングなどを実施してきた。近年、激甚化・頻発化する豪雨により、地すべり発生の危険性が高まっていることから、事業を進める必要がある。 (主な実施内容) 東(地すべり防止工事)：集水ボーリング</p>														
<p>【事業の進捗状況】(R5年度末見込み)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>全体計画(億円)</th> <th>投資事業費(億円)</th> <th>残事業費(億円)</th> <th>進捗率(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全体</td> <td>7.58</td> <td>2.24</td> <td>5.34</td> <td>29.7</td> </tr> </tbody> </table>						全体計画(億円)	投資事業費(億円)	残事業費(億円)	進捗率(%)	全体	7.58	2.24	5.34	29.7
	全体計画(億円)	投資事業費(億円)	残事業費(億円)	進捗率(%)										
全体	7.58	2.24	5.34	29.7										
<p>【社会経済情勢等】 1976年(昭和51年)以降の鴨川アメダス降水量データを見ると、年降水量には大きな変化は認められないが、一度の短時間降雨規模は大きくなる傾向にあり、東においても地すべり発生の危険性が高まる懸念される。 ○投資効果 ・人家戸数18戸(11戸)・県道 鴨川富山線591m(339m)・市道914m(714m) [裸書：全体事業、()：残事業]</p>														
<p>【対応方針(案)】 東の地すべり対策事業の範囲には家屋などの資産があることや、県道鴨川富山線があり、地すべりにより交通が寸断された場合は、地域防災や生活、経済に与える影響は極めて大きく、また、全体事業の費用便益(B/C)は2.43と投資効果も見込まれることから、事業を継続することとする。</p>														


事業概要図

番号	2	事業名	地すべり事業	路線又は箇所名等	地すべり防止区域 東
----	---	-----	--------	----------	------------


東 地すべりブロック平面図

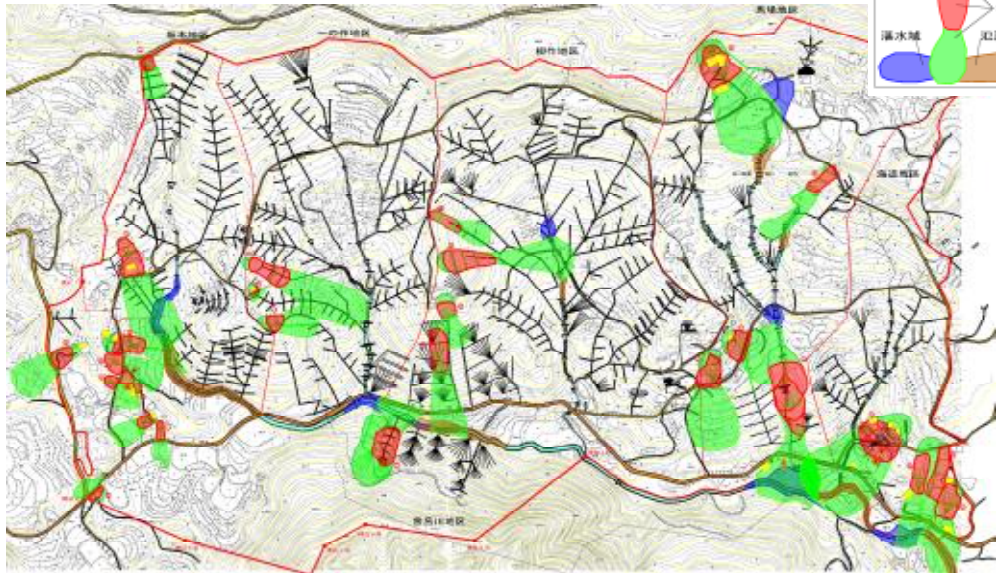

東 地すべりブロック断面図

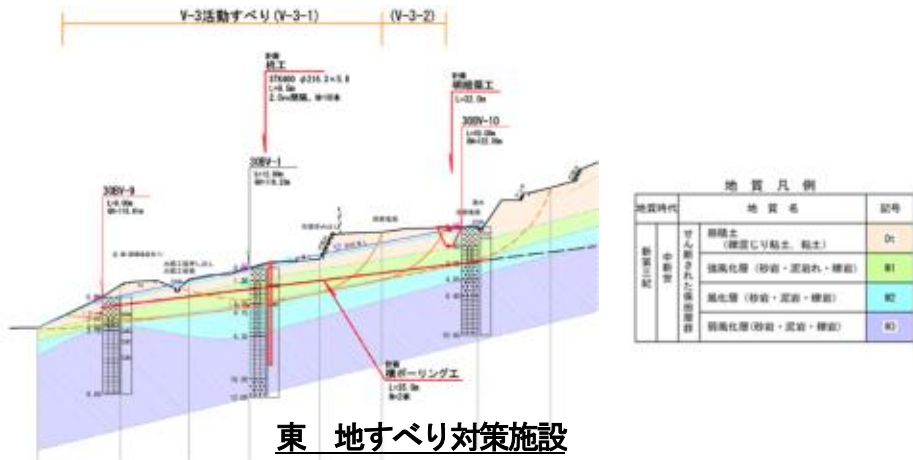

東 地すべり対策施設

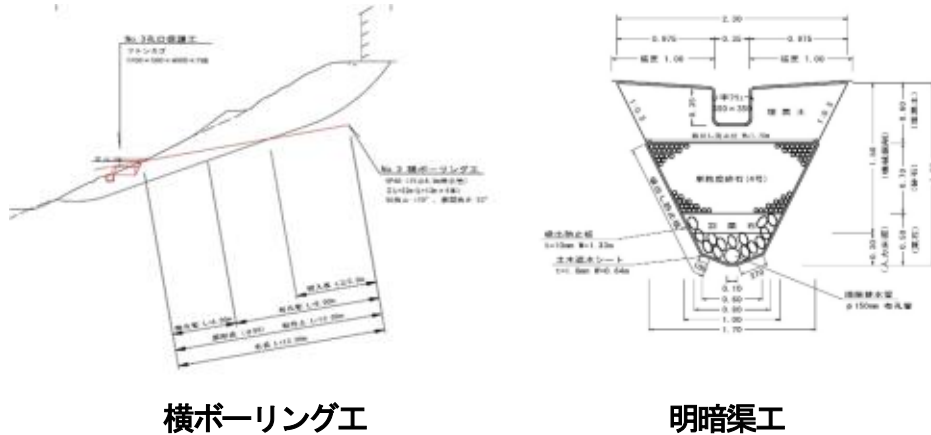

【別紙様式5】

再評価事業に関する調書

番号	2	事業名	地すべり事業	路線又は箇所名等	地すべり防止区域 東
事業化年度	平成 29 年度	用地着手年度	—	工事着手年度	平成 29 年度
【現在計画の概要】					
当初評価実施年度 (基準年)	平成 28 年度	供用開始年度	令和 12 年度	対応方針	継続
B/C	4.40	総費用	3.48 億円	総便益	15.30 億円
現在計画の進捗状況及び再評価時想定 of 5 年後の進捗状況					
	計 画	進捗状況 ()	5 年後の推定進捗状況		
事業費	4.25 億円	2.24 億円 (53%)	—		
うち用地・補償費	0.00 億円	0 億円	—		
うち工事費	4.25 億円	2.24 億円 (54%)	—		
【再評価 (R5 年度) の概要】					
再評価実施年度 (基準年)	令和 5 年度	供用開始年度	令和 12 年度	対応方針	継続
B/C	2.43 [2.12]	総費用	7.35 億円 [4.85 億円]	総便益	17.85 億円 [10.27 億円]
(※上段 : 全体事業、下段 : [] : 残事業)					
現在の進捗状況					
	計 画	進捗状況 (R5 末見込み)			
事業費	7.58 億円	2.24 億円 (30%)			
うち用地・補償費	0.00 億円	0 億円 (0%)			
うち工事費等	7.58 億円	2.24 億円 (30%)			
再評価後の経過及び処理状況	令和 5 年 12 月 千葉県 県土整備公共事業評価審議会 再評価 (継続が妥当である)				
