

(3) 地域整備課

ア かんがい排水事業（一般） りょうそうた こしせん 両総多古支線地区

事業主体：千葉県

管理主体：両総土地改良区

事業工期：平成26年度～令和8年度（予定）

受益面積：A = 333.0ha

事業内容：支線用水路工 L = 3,748m
φ450～φ300

補助率：国50%、県25%、市町村12.5%、地元12.5%

事業の目的等

本地区の用水は、水源の大部分を昭和28年から48年に施工された国営付帯県営両総支線に頼っているが、主要施設は、築後50年が経過し、施設の老朽化や用水の適正配分に支障をきたしている状況にある。

一方で、平成5年に着手した国営両総農業水利事業において用水計画の見直しを行った結果、水源は栗山川統合機場からの取水となった。

このため、国営事業に合わせた用水路線の見直しを行い、県営支線用水路の整備を実施することにより、水田の利用効率を高めるとともに、農業経営の安定化を図るものである。

工事内容

区 分	事 業 量
工 事 費	用水路工 3,748m
測 量 試 験 費	1 式
用地買収及び補償費	1 式
計	

工事進捗状況

年 度	令和6年度まで	令和7年度	令和8年度以降
事 業 量	用水路工 L=3,734m 測量試験費等 N=1式	用水路付帯工 N=1式	用水路付帯工 N=1式
進 捗 率	81.3%	3.0%	15.7%
進捗率(累計)	81.3%	84.3%	100%


※カッコ内の金額は内数



栗山川統合機場



標準断面図(φ300～φ450)

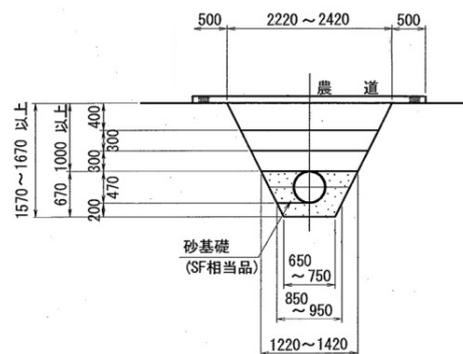

イ かんがい排水事業（一般） かとりしとうぶ 香取市東部地区



事業主体：千葉県
 管理主体：香取市東部土地改良区
 事業工期：平成28年度～令和12年度（予定）
 受益面積：536.3ha
 事業内容：揚水機場工 N=1箇所
 管水路工 L=3.4km
 開水路工 L=1.7km
 補助率：国50%、県25%、市町村10%、地元15%

事業の目的等

本地区は、昭和16年から昭和23年にかけて設置された用水施設が経年劣化による漏水が頻繁に発生し、営農や維持管理等に著しく支障をきたしている。このため老朽化した施設の改修を行うことにより、農業用水の安定供給、合理的水利用、水質保全及び施設管理方法の改善を図り、農業経営の安定化を図るものである。

工事内容

区 分	事 業 量
工 事 費	揚水機場工 1箇所 用水路工 5.1km
測量試験費	1式
用地買収及び補償費	1式
計	

工事進捗状況


年 度	令和6年度まで	令和7年度	令和8年度以降
事 業 量	揚水機場工 N=1箇所 管水路工 L=0.9km 測量試験費等 N=1式 補償費 N=1式	既設管処理工 N=1式 機場付帯工 N=1式 測量試験費等 N=1式	管水路工 L=2.5km 開水路工 L=1.7km 測量試験費等 N=1式
進 捗 率	70.3%	4.5%	25.2%
進捗率(累計)	70.3%	74.8%	100%

※カッコ内の金額は内数

東部揚水機場



標準断面図

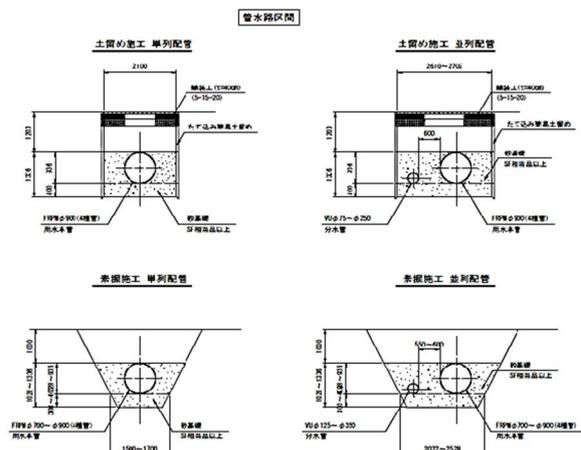

ウ 経営体育成基盤整備事業 もりど 森戸地区

事業主体：千葉県

管理主体：両総土地改良区

事業工期：平成27年度～令和7年度（予定）

事業内容：区画整理工 A=90.5ha

暗渠排水工 A=90.5ha

補助率：国55%、県30%、市町村10%、地元5% ※R4予算から適用

事業の目的等

本地区は、香取市西部に位置し、一級河川大須賀川（用水）と下八間川（排水）に挟まれた水稲を中心とした水田地帯である。農業は本地域の基幹産業であり、先進的な農業経営や規模拡大を志す農家が多く存在する。

本事業の実施により、区画整理による大区画高生産ほ場を設け、暗渠、用排水路、農道の一体的な整備により、生産基盤の確立と営農の省力化を図るとともに農地流動化計画を推進し、将来に向けた担い手農家及び営農組織を育成することで、農業競争力の強化を図るものである。


工事内容

区 分	事 業 量
工事費 区画整理工	90.5ha
暗渠排水工	90.5ha
測量試験費	1式
用地買収及び補償費	1式
換地費	1式
計	

工事進捗状況

年 度	令和6年度まで	令和7年度	令和8年度以降
事業量	区画整理工 A=90.5ha 用水路工 L=10.5km 排水路工 L=6.4km 道路工 L=9.3km 暗渠排水工 A=90.5ha 測量試験費等 N=1式 換地業務 N=1式	換地業務 N=1式	完了
進捗率	98.8%	0.3%	0.9%
進捗率(累計)	98.8%	99.1%	100%

※カッコ内の金額は内数

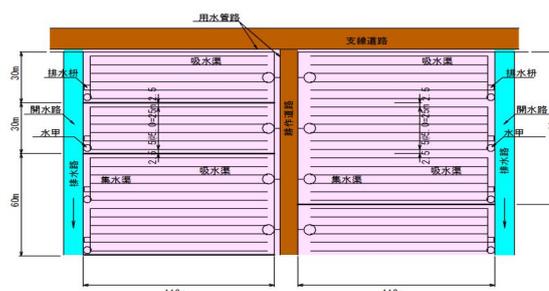

工 経営体育成基盤整備事業 ほりのうち 堀之内地区

事業主体：千葉県

管理主体：両総土地改良区

事業工期：平成30年度～令和9年度（予定）

事業内容：区画整理工 A = 71.7ha

暗渠排水工 A = 62.9ha

補助率：国55%、県30%、市町村10%、地元5% ※R4予算から適用

事業の目的等

本地区は、一級河川大須賀川（用水）と上八間川（排水）に挟まれた、水稻を中心とした優良な水田地域である。

本事業の実施により、区画整理による大区画高生産ほ場を設け、暗渠、用排水路、農道の一体的な整備により、生産基盤の確立と営農の省力化を図るとともに農地流動化計画を推進し、将来に向けた担い手農家及び営農組織を育成することで、農業競争力の強化を図るものである。


工事内容

区 分	事 業 量
工事費 区画整理工	71.7ha
暗渠排水工	62.9ha
測量試験費	1式
用地買収及び補償費	1式
換地費	1式
計	

工事進捗状況

年 度	令和6年度まで	令和7年度	令和8年度以降
事業量	区画整理工 A=71.7ha 揚水機場工（建屋・取水施設）N=2箇所 排水路工 L=5.4km 測量試験費等 N=1式 換地業務 N=1式	用水路工 L=3.0km 測量試験費等 N=1式 換地業務 N=1式	用水路工 L=3.9km 暗渠排水工 A=62.9ha 測量試験費等 N=1式 換地業務 N=1式
進捗率	83.0%	6.7%	10.3%
進捗率(累計)	83.0%	89.7%	100%

※カッコ内の金額は内数

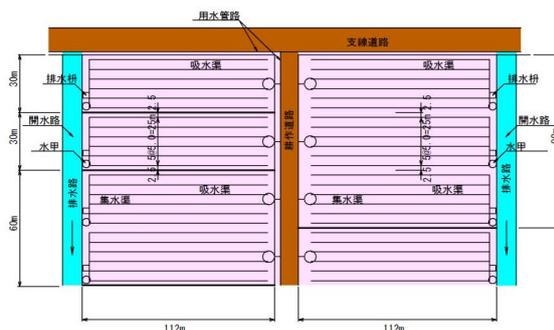

オ 特定農業用管水路等特別対策事業 かほくだい 香北第3地区



事業主体：千葉県

管理主体：香北土地改良区

事業工期：平成27年度～令和8年度（予定）

受益面積：929ha

事業内容：用水路工21.0km、石綿管撤去工17.6km、A=929ha

FRPM管 ϕ 600mm～700mm L= 2.8km

硬質塩化ビニール管(VU) ϕ 300mm～500mm L= 16.3km

硬質塩化ビニール管(VU) ϕ 100mm～250mm L= 1.9km

補助率：国55%、県35%、市町村10%、地元0%

事業の目的等

本地区は、昭和39年度から53年度にかけて実施された県営ほ場整備事業香北地区の第2期及び第2-2期地区である。

当時施工された用水管は価格が安く、施工性も良かったことから、125mm以上の口径では石綿管が使用されている。このことから、石綿管に起因する影響を未然に防止する目的で、石綿を含有しない製品に代替し、農業経営の安全及び農業の持続的発展を図るものである。



工事内容

区 分	事 業 量
工事費（用水路工）	21.0km
測量試験費	1式
用地買収及び補償費	1式
計	

工事進捗状況

年 度	令和6年度まで	令和7年度	令和8年度以降
事 業 量	用水路工 L=19.3km 測量試験費等 N=1式	用水路工 L=1.0km 舗装復旧工 N=1式 測量試験費等 N=1式	付帯工 N=1式 舗装復旧工 N=1式 測量試験費等 N=1式
進 捗 率	89.3%	6.7%	4.0%
進捗率(累計)	89.3%	96.0%	100%

※カッコ内の金額は内数

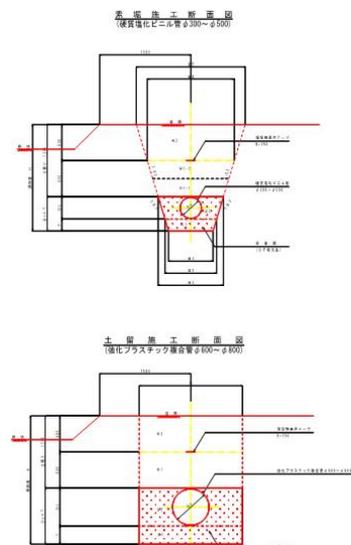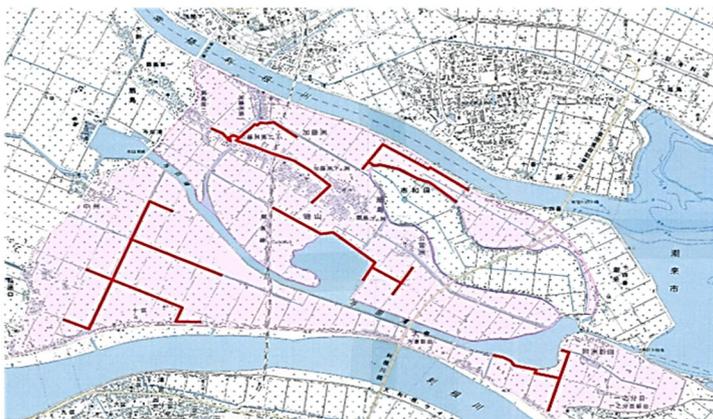

カ 農地中間管理機構関連農地整備事業 まつぎき 松崎地区



事業主体：千葉県

管理主体：下総土地改良区

事業工期：令和2年度～令和10年度（予定）

事業内容：区画整理工 A=25.2ha

暗渠排水工 A=16.5ha

補助率：国62.5%、県30%、市町村7.5%、地元0%

事業の目的等

本地区は、神崎町西部に位置し、水稻を中心とした水田地帯である。地区内は10a～20a区画を標準とした小区画で幅員の狭い農道、用排水路は土水路であり、営農の障害となっている。

そこで、担い手への農地集積・集約化を行い、大型機械による水田営農の低コスト化を図るため、大区画化、用排水施設、暗渠、農道の一体的な整備を行うとともに、高収益作物であるレンコン団地を創設することにより、地域産業の振興を図るものである。


工事内容

区 分	事 業 量
工事費 区画整理工	25.2ha
暗渠排水工	16.5ha
測量試験費	1式
用地買収及び補償費	1式
換地費	1式
計	

工事進捗状況

年 度	令和6年度まで	令和7年度	令和8年度以降
事業量	揚水機場工（建屋・取水施設）N=1箇所 測量試験費等 N=1式 換地業務 N=1式	揚水機場工（ポンプ設備等）N=1式 測量試験費等 N=1式 換地業務 N=1式	区画整理工 A=25.2ha 用水路工 L=2.6km 排水路工 L=2.6km 道路工 L=2.4km 暗渠排水工 A=16.5ha 測量試験費等 N=1式 換地業務 N=1式
進捗率	20.4%	6.6%	73.0%
進捗率(累計)	20.4%	27.0%	100%

※カッコ内の金額は内数

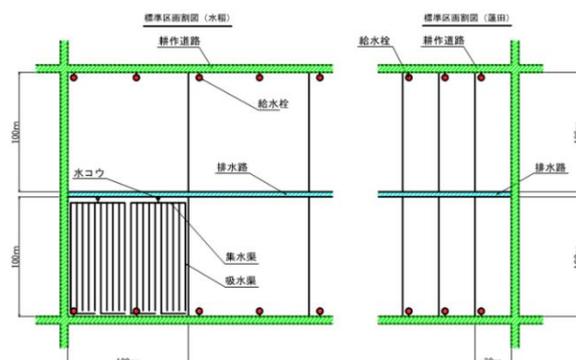

キ 経営体育成基盤整備事業 くろべがわさがんだいさん 黒部川左岸第三地区



事業主体：千葉県

管理主体：香取市黒部川左岸土地改良区

事業工期：令和4年度～令和13年度（予定）

事業内容：区画整理工 A = 166.9ha

暗渠排水工 A = 164.6ha

補助率：国55%、県30%、市町村10%、地元5%

事業の目的等

本地区は、一級河川黒部川沿いの低平地水田地帯で、水稻を中心とした営農が展開されている。本事業の実施により、区画整理による大区画高生産ほ場を設け、暗渠、用排水路、農道の一体的な整備により、生産基盤の確立と営農の省力化を図るとともに農地流動化計画を推進し、将来に向けた担い手農家及び営農組織を育成することで、農業競争力の強化を図るものである。



工事内容

区 分	事 業 量
工事費 区画整理工	166.9ha
暗渠排水工	164.6ha
測量試験費	1式
用地買収及び補償費	1式
換地費	1式
計	

工事進捗状況

年 度	令和6年度まで	令和7年度	令和8年度以降
事業量	測量試験費等 N=1式 換地業務 N=1式	測量試験費等 N=1式 換地業務 N=1式	区画整理工 A=166.9ha 用水路工 L=16.0km 排水路工 L=20.5km 道路工 L=17.5km 暗渠排水工 A=164.6ha 測量試験費等 N=1式 換地業務 N=1式
進捗率	3.6%	1.4%	95.0%
進捗率(累計)	3.6%	5.0%	100%

※カッコ内の金額は内数

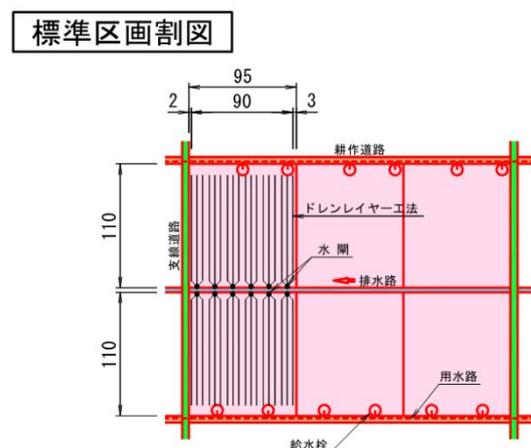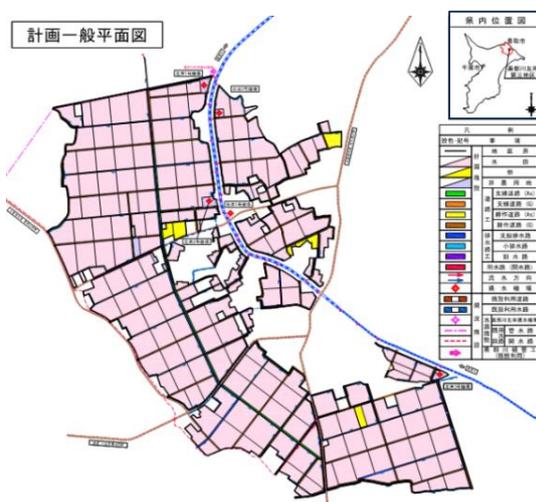

ク 経営体育成基盤整備事業 ふなこし 船越地区

事業主体：千葉県

管理主体：両総土地改良区

事業工期：令和6年度～令和10年度（予定）

事業内容：区画整理工 A = 109.3ha

暗渠排水工 A = 109.3ha

客土工 A = 3.5ha

補助率：国65%、県30%、市町村2.5%、地元2.5%



事業の目的等

本地区は、千葉県北東部に位置し、栗山川中流域に展開する肥沃な水田地帯である。ほ場は10aの小区画で暗渠排水がなく、農道も狭いため、大型農業機械の使用が困難である。

このため、本事業において、ほ場の区画整理及び道路、用排水路を整備し、生産性を高めるとともに担い手の育成と経営の安定化を図る。

工事内容

区 分	事 業 量
工事費 区画整理工	109.3ha
暗渠排水工	109.3ha
客土工	3.5ha
測量試験費	1式
用地買収及び補償費	1式
換地費	1式
計	

工事進捗状況

年 度	令和6年度まで	令和7年度	令和8年度以降
事 業 量	測量試験費等 N=1式	測量試験費等 N=1式 換地業務 N=1式	区画整理工 A=109.3ha 用水路工 L=14.3km 排水路工 L=10.2km 道路工 L=15.2km 暗渠排水工 A=109.3ha 客土工 A=3.5ha 測量試験費等 N=1式 換地業務 N=1式
進 捗 率	0.4%	1.6%	98.0%
進捗率(累計)	0.4%	2.0%	100%

※カッコ内の金額は内数

農業競争力強化農地整備事業（農地整備事業） 船越地区

