

事業名	総合流域防災事業
路線・河海名	一級河川利根川水系 小野川
工事箇所	香取市 佐原イ

小野川は源を香取市下小野に発し、途中香西川を合わせて流下した後、香取市街地中心部を貫流し利根川に合流する流域面積36.0km²、指定延長約5.8kmの一級河川である。

利根川洪水時にはその水位の影響を受けるとともに、現河道の流下能力不足や橋梁が障害となり、市街地ではたびたび浸水被害を生じていた。

市街地の人家が密集している地域では、川幅を広げることが困難であったことから、洪水をバイパスし直接利根川に排水する小野川放水路を平成16年に完成させ、その後の浸水被害は大幅に減少した。


しかしながら、市街地を流れる小野川本川は放水路完成後も時間雨量30mm（年超過確率で1/2）程度の降雨に対応する治水安全度しかないことから、護岸の嵩上げや河道掘削等を行い時間雨量50mm（年超過 確率1/5）に対応できる河川整備を進めている。

計 画 概 要		
全 体 計 画	令和2年度迄実績	令和3年度計画
総事業費 3,025百万円 H16～H31 L=2,720m 築堤：1,152m ³ 掘削：19,000m ³ 嵩上げ：616m 護岸：2,279m 道路橋：5橋 用地買収：6,480m ² 補償：14件	事業費 741百万円 事業内容 嵩上げ：616m 護岸工：457m 道路橋：1橋 用地買収：1,283m ² 補償：6件 事業進捗率 24.5% 用地買収進捗率 19.8%（面積）	事業費 158百万円 事業内容 工事：護岸工 94m（右岸） 護岸工 114m（左岸） 委託：家屋事前調査 1式 事業進捗率 29.7% 用地買収進捗率 19.8%（面積）

〈箇所図〉



〈標準断面図〉

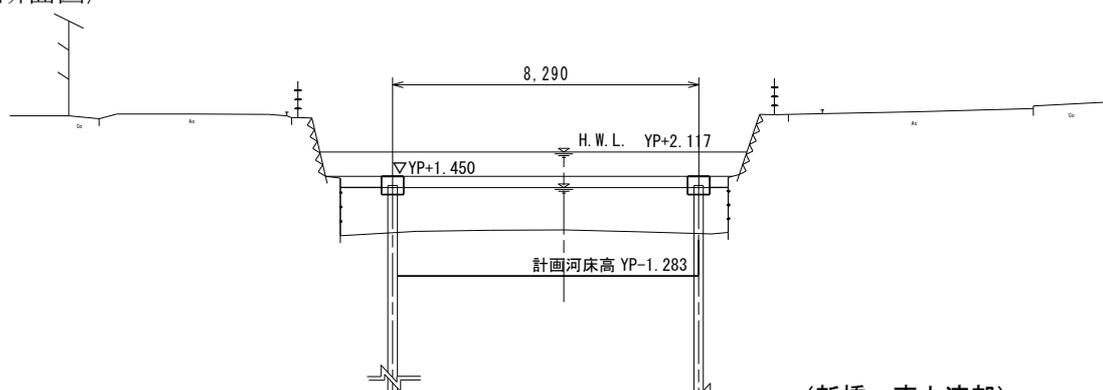

（新橋 志し追加）
