


事業名	防災・安全交付金事業 歩道設置	
路線名	(一) 夏見小室線	
工事箇所	船橋市北本町	
<p>(概要) 交通事故が多発している道路において、歩行者の安全を確保し、交通環境の改善を行うことにより交通事故を防止し、併せて交通の円滑化を図るため歩道の整備を進めている。</p>		
全体計画	前年度までの実績	今年度の計画
総事業費：1,600百万円 事業期間：平成20年度～令和4年度 事業延長：900m 幅員：13.9m 用地取得：7,600㎡ 物件補償：85件	事業費：1050百万円 (進捗率：66%) 用地取得：2,400㎡ 物件補償：43件 本工事：357m	事業費：3百万円 (進捗率：66%) 物件調査：1件

【位置図】

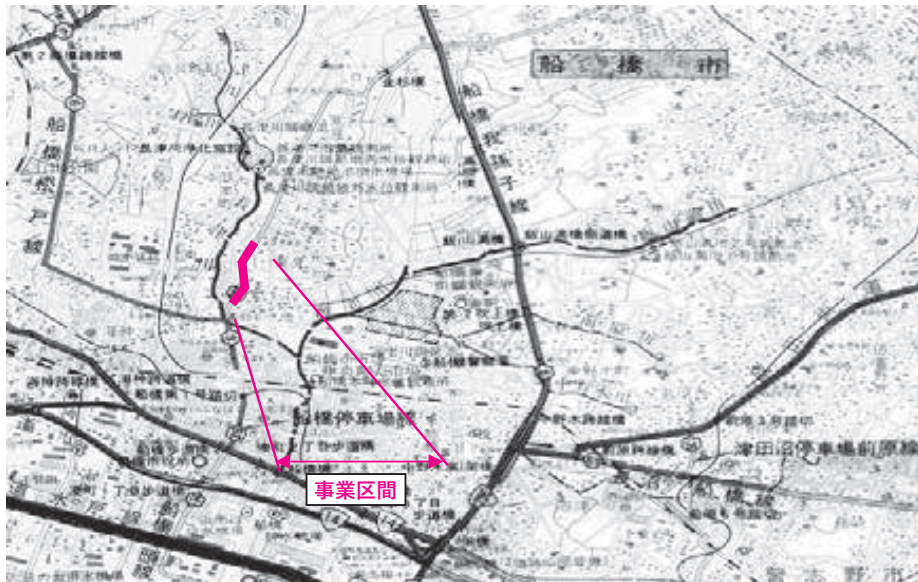

【代表断面】

船橋市 夏見2丁目

