

# 浦安市公共下水道事業 事業再々評価

平成20年11月  
千葉県浦安市

## 浦安市の概要

浦安市は、かつては漁業を中心に生計を営んでいた小さな集落でありました。

昭和39年からの埋め立て事業により、市域が約4倍に拡大し、今では、東京ディズニーリゾートなどを抱えたアーバンリゾートとして急成長を遂げ、市域全域が市街化区域となっております。




## 事業の必要性(汚水)



### 【汚水】

- 生活環境の改善
- 公共用水域の水質保全

H19



S23

## 下水道事業の概要






## 指標1 費用効果分析

総 便 益 ( B )	4,081 億円
総 費 用 ( C )	1,716 億円
費用便益費 ( B / C )	2.4

## 指標2 事業の進捗状況

指 標	状 況
事業の進捗状況	平成20年度までの整備面積は、事業計画1,697haに対して1,578haを整備し、整備率は93%である。
供用開始区域の接続状況	接続率は95%である。
地元情勢等	市議会及び地元住民の理解・協力は得られている。

## 指標2 事業の進捗状況

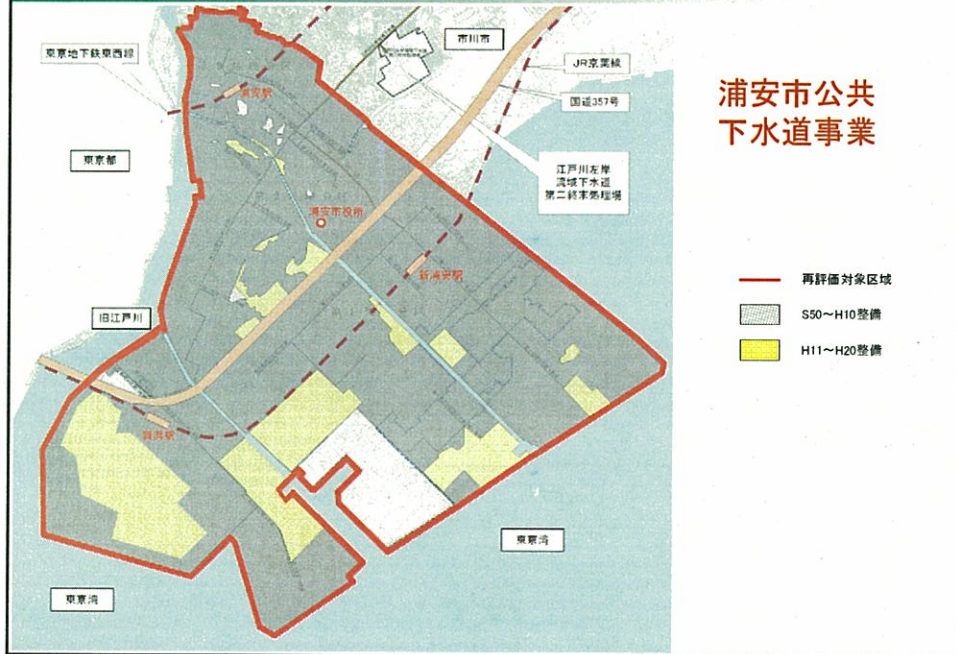

## 指標3 社会経済情勢等

指標	状況
社会経済情勢	宅地開発計画があるものの、既に下水道計画に見込んでいるため、下水道事業に影響のある大きな社会経済情勢の変化は特にはない。
自然環境条件	河川の水質汚濁に係る水質環境基準に変更はない。
計画変更の有無及びその程度	全体計画及び事業計画について、必要に応じ適切に見直している。



## 指標4 コスト縮減・代替案

指標	状況
コスト縮減	アスファルト合材・路盤砕石等再生資材の利用によりコスト縮減に努めている。
代替案	本市の市街化の状況から、代替としての浄化槽整備よりも、下水道整備が最適。

## 対応方針(案)

浦安市公共下水道事業は順調に進展しており、今後も順調な進展が見込まれることから、当事業を継続していく方針です。
