

再評価実施事業調書

番号	2	事業名	河川事業		路線又は箇所名等		一級河川利根川水系 鹿島川・高崎川		
事業所管課		河川整備課		事業主体		千葉県			
事業化 年度	平成 3年度	用地着手 年度	平成 6年度	工事着手年度 工事終了(認可)年度	平成8年度 令和19年度	再評価の 理由	再々評価		
費用便益比 B/C	3.5 (1.2)	総費用 (現在価値)	364億円 (47億円)	総便益 (現在価値)	1,286億円 (54億円)	基準年	令和 3年度	供用開始 年度	令和 19年度

※上段：全体事業費 下段()：残事業費

【事業概要】

(目的)

鹿島川・高崎川では、平成3年から河川改修事業に着手しているが、平成3年、平成8年、および平成13年の台風や豪雨により記録的な浸水被害を受けたことから、河道掘削、堤防の嵩上げ、護岸整備等を実施してきた。

しかし、平成25年の台風により、佐倉市をはじめとする印旛沼流域で約100戸の浸水被害が発生、さらに令和元年10月豪雨でも、鹿島川・高崎川流域にて大規模な浸水被害が発生しており、今後も、市街化の進展により流域からの流出量の増加が見込まれることから、早急に治水安全度の向上を図る必要がある。

(主な実施内容)

鹿島川：事業延長 L=2,700m 工事内容 河道掘削、築堤等
高崎川：事業延長 L=2,650m 工事内容 河道掘削、築堤等

【事業の進捗状況】(令和3年度末見込み)

	全体計画(億円)	投資事業費(億円)	残事業費(億円)	進捗率(%)
全体	197.0	147.2	49.8	74.7

【社会経済情勢等】

① 流域状況

本流域は、首都圏への通勤圏に位置することから市街化が進展しており、流域からの流出量の増加が見込まれることから、治水安全度の向上が急務である。氾濫区域には、佐倉市街地や上水道、工業用水の浄水場の他、JR総武本線、国道296号などの交通網を含み、水害発生時の被害、社会的影響が極めて大きい地域である。

② 主な水害状況

- ・ 台風15号 (平成3年9月) 浸水面積146ha 浸水家屋 91戸
- ・ 台風17号 (平成8年9月) 浸水面積148ha 浸水家屋 99戸
- ・ 集中豪雨 (平成13年10月) 浸水面積130ha 浸水家屋 86戸
- ・ 台風26号 (平成25年10月) 浸水面積639ha 浸水家屋 102戸
- ・ 集中豪雨 (令和元年10月) 浸水面積610ha 浸水家屋 73戸

③ 投資効果

- ・ 浸水世帯 974世帯 (246世帯) ・ 浸水面積 127ha (63ha) [裸書:全体事業、():残事業]

④ その他

- ・ 一級河川利根川水系 手賀沼・印旛沼・根木名川圏域河川整備計画の策定 H19.7.10


【対応方針(案)】

鹿島川・高崎川流域では、市街化の進展により流出増が見込まれ、さらに本治水事業への地元からの要望が大きく、また、全体事業費の費用便益(B/C)は3.5(残事業1.2)となり、事業の投資効果も見込まれることから、事業を「継続」し、計画的な事業の推進を図る。

事業概要図


番号	2	事業名	河川事業	路線又は箇所名等	一級河川利根川水系 鹿島川・高崎川
----	---	-----	------	----------	----------------------

計画平面図

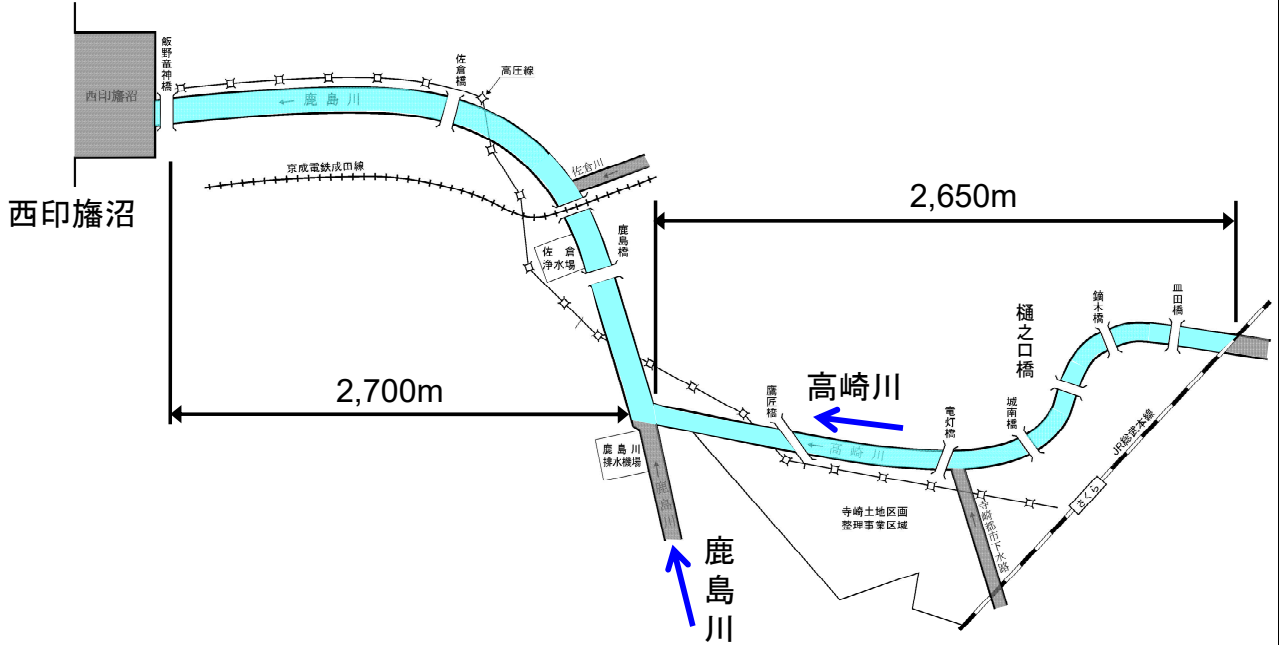


標準横断面図

●鹿島川 (L=2,700m)



●高崎川 (L=2,650m)

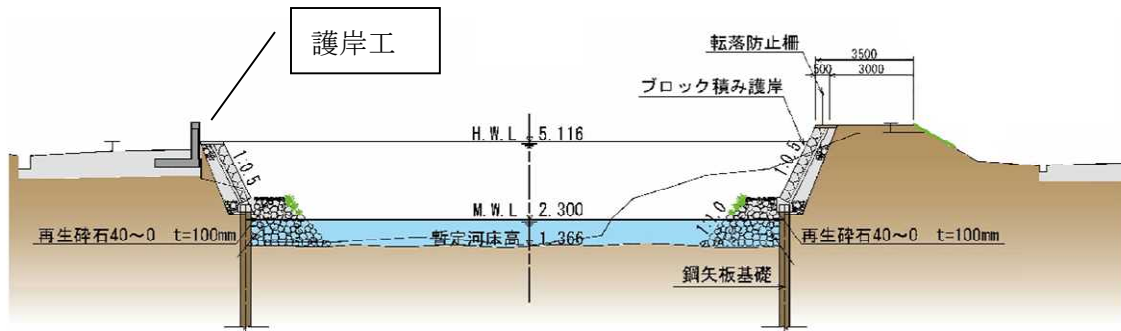

再々評価事業に関する調書

番号	2	事業名	河川事業	路線又は 箇所名等	一級河川利根川水系 鹿島川・高崎川													
事業化年度	平成3年	用地着手年度		平成6年	工事着手年度	平成8年												
【再々評価（平成28年度）の概要】																		
再評価実施年度 （基準年）	平成28年度	供用開始年度	令和19年度	対応方針	継続													
B/C	3.8 [1.5]	総費用	285.3億円 [54.6億円]	総便益	1,085.6億円 [79.8億円]													
<p>（※上段：全体事業、下段：[]：残事業）</p> <p>再評価時の委員会の意見及び当時の状況 ○継続することが妥当である。</p>																		
<p>再評価時の進捗状況及び再評価時想定の5年後の進捗状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>計 画</th> <th>進捗状況（H28）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費</td> <td>197.0億円</td> <td>132.6億円（67.3%）</td> </tr> <tr> <td>うち用地・補償費</td> <td>54.3億円</td> <td>48.8億円（89.8%）</td> </tr> <tr> <td>うち工事費</td> <td>142.7億円</td> <td>83.8億円（58.7%）</td> </tr> </tbody> </table>								計 画	進捗状況（H28）	事業費	197.0億円	132.6億円（67.3%）	うち用地・補償費	54.3億円	48.8億円（89.8%）	うち工事費	142.7億円	83.8億円（58.7%）
	計 画	進捗状況（H28）																
事業費	197.0億円	132.6億円（67.3%）																
うち用地・補償費	54.3億円	48.8億円（89.8%）																
うち工事費	142.7億円	83.8億円（58.7%）																
【再々評価（令和3年度）の概要】																		
再評価実施年度 （基準年）	令和3年度	供用開始年度	令和19年度	対応方針	継続													
B/C	3.5 [1.2]	総費用	364億円 [47億円]	総便益	1,286億円 [54億円]													
<p>（※上段：全体事業、下段：[]：残事業）</p> <p>現在の進捗状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>計 画</th> <th>進捗状況（R3末見込み）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費</td> <td>197.0億円</td> <td>147.2億円（74.7%）</td> </tr> <tr> <td>うち用地・補償費</td> <td>52.2億円</td> <td>49.7億円（95.2%）</td> </tr> <tr> <td>うち工事費等</td> <td>144.8億円</td> <td>97.5億円（67.3%）</td> </tr> </tbody> </table>								計 画	進捗状況（R3末見込み）	事業費	197.0億円	147.2億円（74.7%）	うち用地・補償費	52.2億円	49.7億円（95.2%）	うち工事費等	144.8億円	97.5億円（67.3%）
	計 画	進捗状況（R3末見込み）																
事業費	197.0億円	147.2億円（74.7%）																
うち用地・補償費	52.2億円	49.7億円（95.2%）																
うち工事費等	144.8億円	97.5億円（67.3%）																
再評価後の 経過 及び 処理状況	平成28年12月 千葉県 県土整備公共事業評価審議会 再々評価 （継続が妥当である）																	
