

【別紙様式3】

再評価実施事業調書

番号	5	事業名	印旛沼流域下水道事業		路線又は箇所名等		印旛処理区		
事業所管課		下水道課			事業主体			千葉県	
事業化年度	S43	用地着手年度	S43	工事着手年度	S43	再評価の理由	再々評価		
費用便益比 (B/C)	1.8 (1.3)	総費用	54,721 億円 (2,611 億円)	総便益	99,104 億円 (3,368 億円)	基準年	R2	供用開始年度	S49

※上段：全体事業費 下段（ ）：残事業費

【事業概要】

項目	全体計画 (目標年次:R6)	事業計画 (完成予定年次:R5)	整備状況 (R1 年度末見込み)
処理区域面積 (ha)	27,391.4ha	19,893.0ha	17,977.0 ha
処理人口 (人)	1,406,200 人	1,337,485 人	1,313,715 人
花見川終末処理場 (m ³ /日)	282,000 m ³ /日	369,800 m ³ /日	395,200 m ³ /日
花見川第二終末処理場 (m ³ /日)	539,000 m ³ /日	355,600 m ³ /日	283,600 m ³ /日
事業費 (億円)	3,870 億円	3,547 億円	3,219 億円

【事業の進捗状況】

指 標	状 況
事業の進捗状況	全体計画 27,391ha に対し、整備済は 17,977ha であり、整備率は 66% 全体計画 1,406,200 人に対し、整備済は 1,313,715 人であり、普及率は 93%
処理場用地の取得状況	花見川及び花見川第二終末処理場用地は取得済みである。
処理施設の供用状況	全体計画の処理能力 821,000 m ³ /日に対し、678,800 m ³ /日を整備済である。
供用開始区域の接続状況	接続率は 97% である。
地元情勢等	県議会及び関連市、地元等の理解・協力は得られている。

【社会経済情勢等】

指 標	状 況
社会経済情勢	新たな大規模宅地及び団地開発等はない。
自然環境条件	水質汚濁に係る新たな環境基準の設定はない。
計画変更の有無 及びその程度	全体計画は平成 22 年度に見直しており、前回再評価から変更なし。

【コスト縮減・代替案】

指 標	状 況
コスト縮減	既存施設について、包括的民間委託による維持管理コストの縮減や、ストックマネジメントの導入によるライフサイクルコストの縮減を図っている。 令和 2 年度から公営企業会計を適用することにより、中長期的な視点にたった計画的な経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図っている。 下水汚泥処理施設の効率的な整備に向けて、汚泥の資源化・エネルギー利用を検討している。 広域化・共同化の取り組みにより市町村事業を含めた総コストの縮減を検討している。 全県域汚水適正化処理構想を策定し適切な計画区域を設定している。
代替案	浄化槽と下水道の費用比較の結果、下水道が経済的である。また、単独公共下水道と流域下水道では、流域下水道が経済的である。

【対応方針 (案)】


費用効果分析の結果から、流域下水道事業の投資効果が見込める。下水道の整備率の向上とともに生活環境の改善や、公共用水域の水質保全等に寄与している。

代替案との比較結果から、流域下水道での整備が経済的である。

事業の必要性が高いことから、引き続き事業を継続、推進していく。

【別紙様式4】

事業概要図					
番号	5	事業名	印旛沼流域下水道事業	路線又は箇所名等	印旛処理区

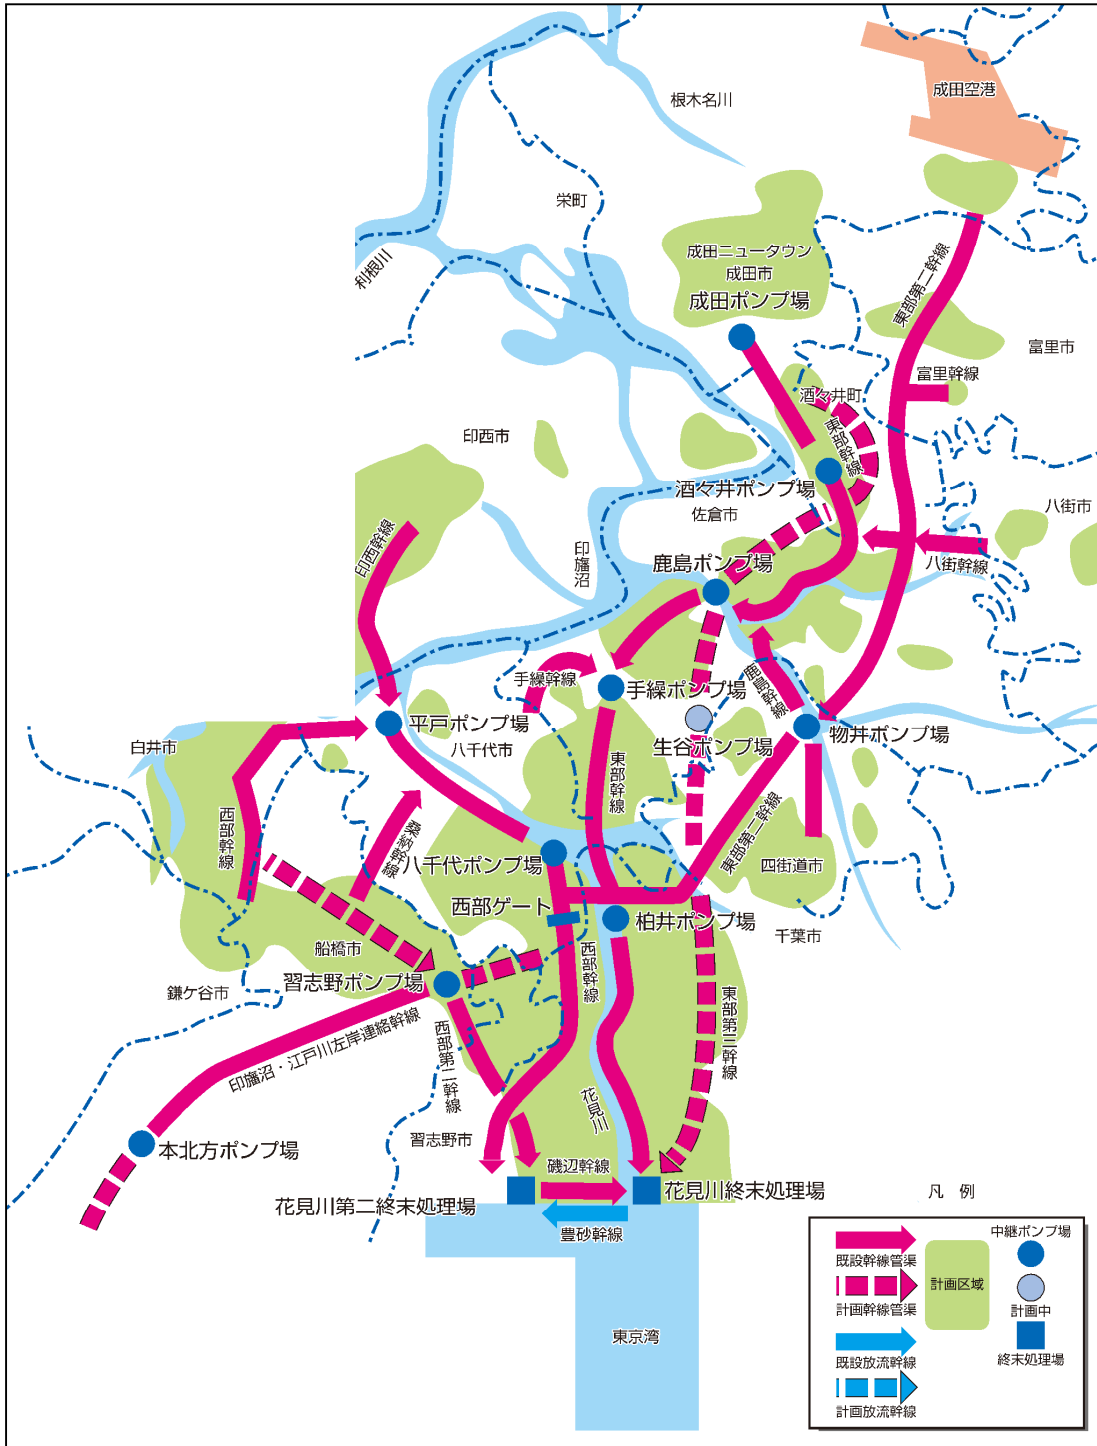

【別紙様式 5】

再々評価事業に関する調書

番号	5	事業名	印旛沼流域下水道事業		路線又は箇所名等	印旛処理区
事業化年度	昭和43年度	用地着手年度	昭和44年度	工事着手年度	昭和43年度	
【再評価の概要】						
再評価実施年度 (基準年)	H27	供用開始年度	S49	対応方針	事業継続	
B/C	2.3	総費用	32,843億円	総便益	74,580億円	
再評価時の委員会の意見及び当時の状況						
<ul style="list-style-type: none"> 事業の継続が妥当であるとの意見を頂いた。 						
再評価時の進捗状況及び再評価時想定の5年後の進捗状況						
	計 画	進捗状況(H27)	5年後の想定進捗状況(R2)			
全体事業費	3,870億円	3,210億円	3,349億円			
用地取得面積	45ha	45ha	45ha			
供用面積(延長)	27,391ha	17,532ha	19,323ha			
【再々評価の概要】						
再評価実施年度 (基準年)	R2	供用開始年度	S56	対応方針	事業継続	
B/C	1.8	総費用	54,721億円	総便益	99,104億円	
再々評価時の進捗状況						
	計 画	進捗状況				
全体事業費	3,870億円	3,219億円				
用地取得面積	45ha	45ha				
供用面積(延長)	27,391ha	18,259ha				
再評価後の 経過及び 処理状況	<ul style="list-style-type: none"> 平成10年度 事業再評価 平成13年度 利根川流域別下水道整備総合計画の変更 平成13年度 全体計画の変更、事業計画の変更 平成20年度 事業再々評価 平成21年度 東京湾流域別下水道整備総合計画の変更 平成22年度 利根川流域別下水道整備総合計画の変更 全体計画の変更、事業計画の変更 平成27年度 事業再々評価 平成30年度 事業計画の変更 					
