


事業名	県単道路改良（一般）事業
路線・河海名	一般県道 郡停車場大須賀線
工事箇所	香取郡神崎町 立野

一般県道郡停車場大須賀線は、神崎工業団地を經由して国道51号と国道356号を南北に結ぶ神崎町の骨格道路である。また、成田市と神崎町で計画している市町道とアクセスし、今後、県道成田下総線とネットワークを結ぶ路線でもある。

「神崎町四季の丘」に関連した大貫工区の整備は、平成11年4月に978mを、平成26年11月に206mの供用を開始し、全線開通した。今後は立野工区の整備を行い、国道356号から市町道アクセス点まで、一連区間の早期供用を図る。

計 画 概 要		
全 体 計 画	令和2年度迄実績	令和3年度計画
<b>【大貫工区・立野工区】</b> 総事業費 2,000百万円 H5～ L=1,501m W=6.0(13.0)m 用地買収 A=30,065㎡	事業費 1,420百万円 事業内容 工事：改良工1式 用地買収：20,909㎡  事業進捗率 71.2% 用地買収進捗率 69.1%(面積)	事業費 40百万円 事業内容 用地補助委託 1式 (鑑定・物件調査) 相続人調査 1式 事業進捗率 73.0% 用地買収進捗率 69.1%(面積)

<箇所図>

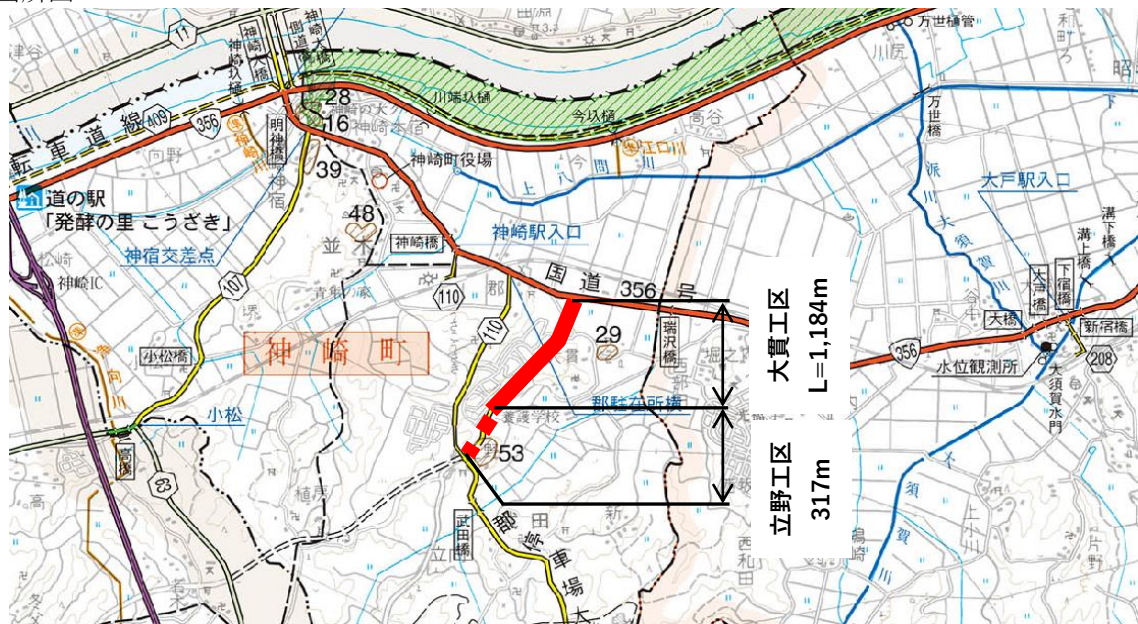

<標準横断面図>

